

Resumen del proyecto de  
Restauración del bosque de  
galería en el Refugio del Salto  
del 25 de abril al 18 de mayo


# Avances de obra Restauración

Semana del 25 al 2 de abril 2024

# Avances primera semana

- Conformación de terrazas y trabajo con angulos en las terras de la zona 1 y 3
- Limpieza y reacomodo de piedras

zona 1	árboles grandes	14
605 m	árboles medianos	21
	27% arbustos	500
zona 2	árboles grandes	27
1000 m	árboles medianos	43
	45% arbustos	1000
zona 3	árboles grandes	14
561 m	árboles medianos	21
	26% arbustos	500

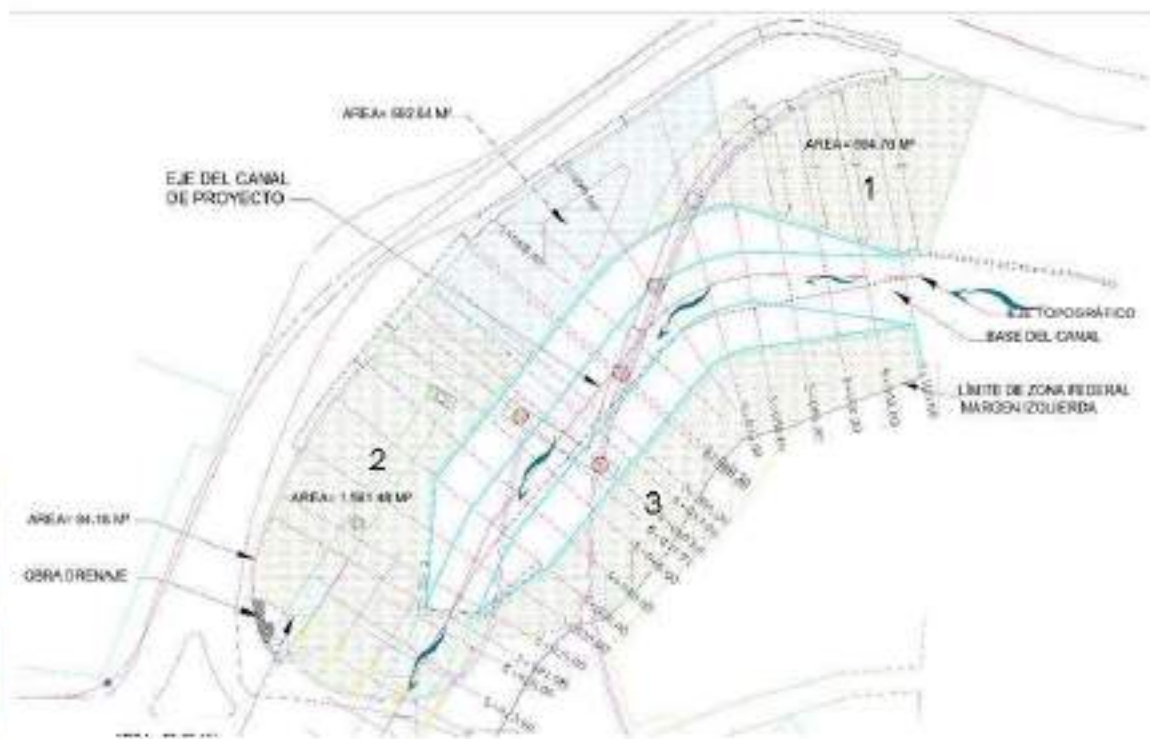

# Fotos de avance de obra

- Zona 1



# Zona 1



# Zona 1



# Fotos de avance de obra

- Zona 3





# Avances de obra Restauración

Semana del 2 al 8 de abril 2024

# Avances segunda semana

- Conformación de terrazas y trabajo con angulos en las terras de la zona 2 y 3
  - Limpieza y reacomodo de piedras
  - Descompactando con la retroescavadora
- y moviendo tierra zona 2
- Haciendo los hoyos para la plantación de la zona 2

# Conformación con la etapa 1 en la zona 3



Comenzamos con la etapa 1 en la zona 3



Comenzamos con la etapa 1 en la zona 3



Comenzamos con la etapa 1 en la zona 3



## Descompactando y moviendo tierra zona 3



## Descompactando y moviendo tierra zona 3





Zona 1  
Haciendo los hoyos para  
la plantación



Zona 1  
Los hoyos listos para la  
Plantación del estrato alto  
y medio  
Y el Naturabono al fondo



Zona 1  
Especies vegetales  
Estrato alto y medio



# Avances de obra Restauración

Semana del 9 al 16 de abril 2024

# Avances tercer semana

- Conformación de terrazas y trabajo con angulos en las terras de la zona 2 y 3
- Limpieza y reacomodo de piedras zona 1, 2 y 3
- Descompactando con la retroescavadora  
y moviendo tierra zona 1
- Conformación de la zona 1
- Haciendo los hoyos para la plantación de la zona 2
- Preparación de los dos sustratos de composta para la plantación de la zona 2
- Plantación de los árboles estado alto y medio de la zona 2

Maquina conformando la zona 2



## Comienzo de la conformación de terrazas .Zona 2



## Conformación de terrazas. Zona 1





## Conformación de terrazas Zona 1



Dos diferentes tipos de composta para la plantación de la Zona 1



Con los dos tipos de composta se inició la plantación de la Zona 1



Plantación de la Zona 1 y riego



Plantación de la Zona 1 y riego



Plantación de la Zona 1 y riego



## Plantación de la Zona 1 y riego



# Avances de obra Restauración

Semana del 16 al 22 de abril 2024





**Plantando los setos de la zona 1**



## Conformación de terrazas .Zona 2



- Conformación de terrazas. Zona 2 y abajo del puente



Zona 2 Estabilizar terrazas, Realizar curvas de nivel



### Zona 3 Detalle de las curvas de nivel y estabilidad de terrazas





- Riego y mantenimiento de la plantación de la Zona 1

Detalle de la conformación, curvas de nivel y ángulos de la zona 2



Movimiento de agua para consolidar terrazas





# Avances de obra Restauración

Semana del 23 al 30 de abril 2024

# Avances quinta semana

- Conformación de terrazas y trabajo con angulos en las terras de la zona 2 y 3 y moviendo tierra zona 1
- Conformación de la zona 1
- Preparando la zona de bajo puente para recibir el agua
- Preparación del sustrato de dos compostas y plantación de arbustos de la zona 2
- Manteniendo con riego la zona 2



Conformación de la zona baja del puente

Brotos nuevos y semillas de los árboles ya plantados



- Conformación y manejo de agua en la zona 3



Zona 1 Regando y conformando terrazas



## Zona 1 regando y conformando terrazas



## Conformando debajo del puente





## Zona 1 Recubriendo las terrazas con hojarasca



## Zona 1 Recubriendo las terrazas con hojarasca



# Avances de obra Restauración

Semana del 1 al 7 de mayo 2024

# Avances sexta semana

- Conformación de la zona de bajo puente
- Afinando conformación y terrazas de la zona 1
- Manteniendo con riego la zona 2
- Plantando arbustos de la zona 2



Conformación de la zona baja del puente

Taludes y terrazas conformadas para ponerles agua y estabilizarlas



- Conformación y manejo de agua en el bajo puente



Zona 2 Regando y conformando terrazas





## Zona 1 Plantando la última parte del estrato bajo



Zona 1 Plantando la última parte del estrato bajo



# Avances de obra Restauración

Semana del 15 al 18 de mayo 2024

# Avances séptima semana

- Plantación de la zona 3
- Manteniendo con riego la zona 2
- Evento comunitario de 4 escuelas de la zona para compartir como es una restauración y llenar de buenas acciones el lugar

## Plantación de la zona 3



## Plantación de la zona 3



## Plantación de la zona 3



Plantación de la zona 3





## Evento comunitario



## Evento comunitario




## Evento comunitario



Evento comunitario



zona 1	árboles grandes	14
605 m	árboles medianos	21
	27% arbustos	500
zona 2	árboles grandes	27
1000 m	árboles medianos	43
	45% arbustos	1000
zona 3	árboles grandes	14
561 m	árboles medianos	21
	26% arbustos	500

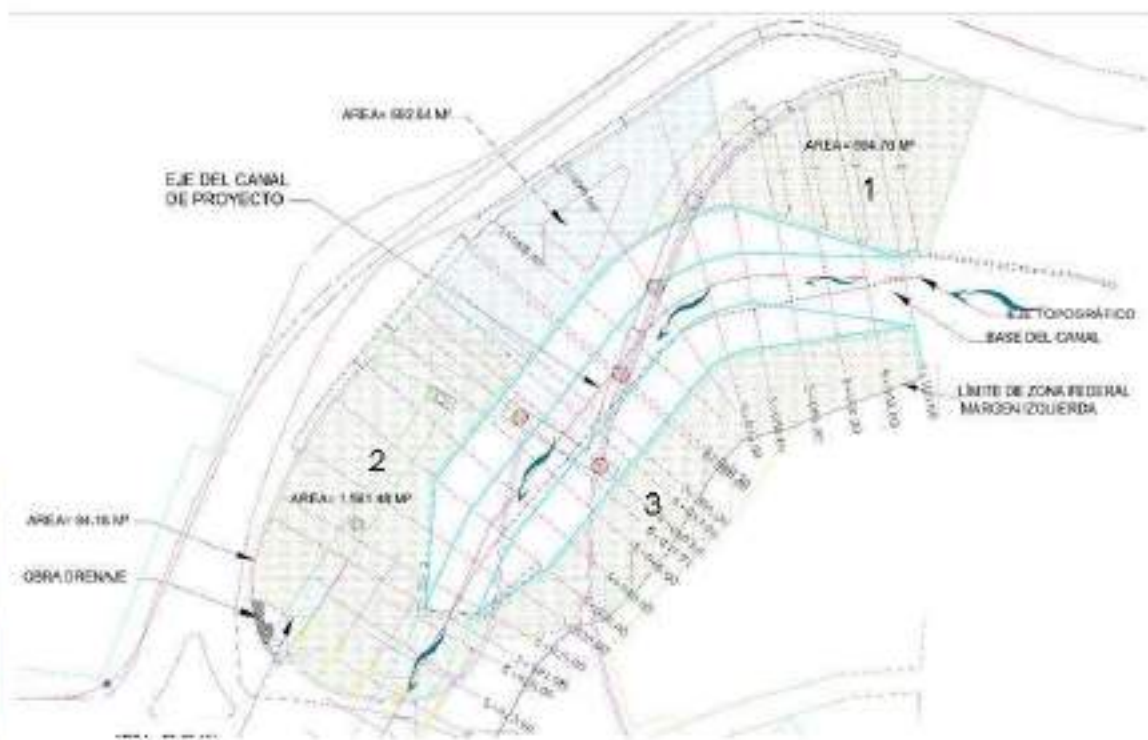

# Avances de obra Restauración

Semana del 15 al 18 de mayo 2024

# Avances séptima semana

- Plantación de la zona 3
- Manteniendo con riego la zona 2
- Evento comunitario de 4 escuelas de la zona para compartir como es una restauración y llenar de buenas acciones el lugar

## Plantación de la zona 3





## Plantación de la zona 3



## Plantación de la zona 3



Plantación de la zona 3



## Evento comunitario



## Evento comunitario



## Evento comunitario



Evento comunitario



Avances de obra

- Zona 1 30%
- Zona 2 100%
- Zona 3 50%

zona 1	arboles grandes	14
605 m	arboles medianos	21
	27% arbustos	500
zona 2	arboles grandes	27
1000 m	arboles medianos	43
	45% arbustos	1000
zona 3	arboles grandes	14
561 m	arboles medianos	21
	28% arbustos	500

